




H144 Transchablaisienne

Rennaz – Les Evouettes

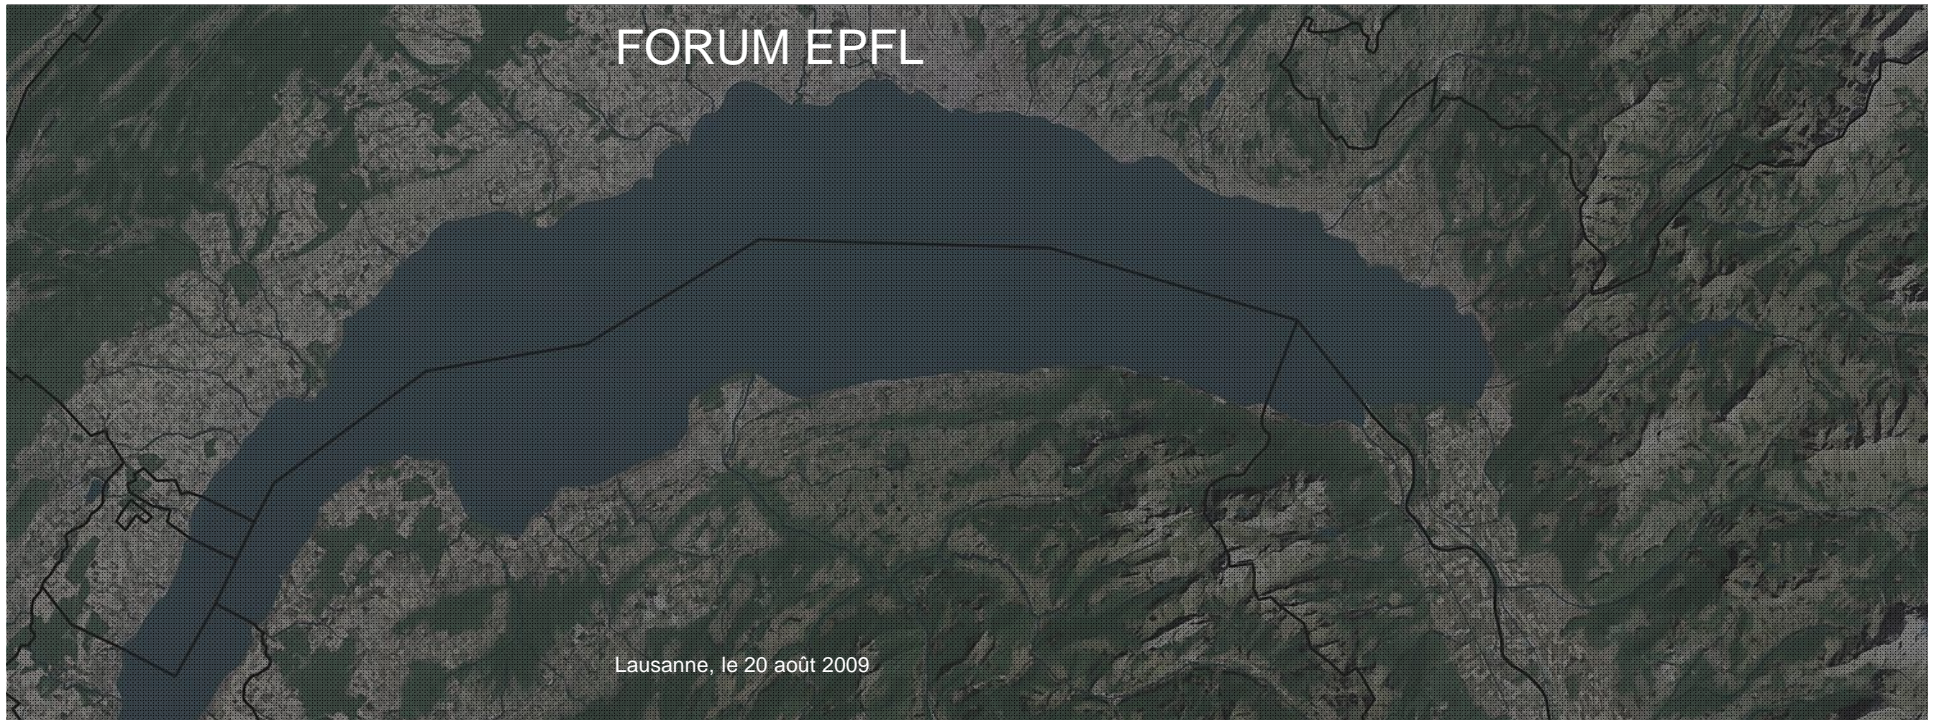

entre Vaud et Valais, une voie de transit au bout du lac



entre Vaud et Valais, une voie de transit au bout du lac



une route longtemps attendue




-
- 1961 Arrêté du Conseil fédéral
- 1992 Variante des communes vaudoises
- 2002 Enquête publique
- 2003 Crédit d'ouvrage / VD
- 2005 Concours pour les ouvrages d'art


une route longtemps attendue




2007 Arrêt du Tribunal fédéral
Premiers travaux sur la RC 780
Subvention fédérale 62%

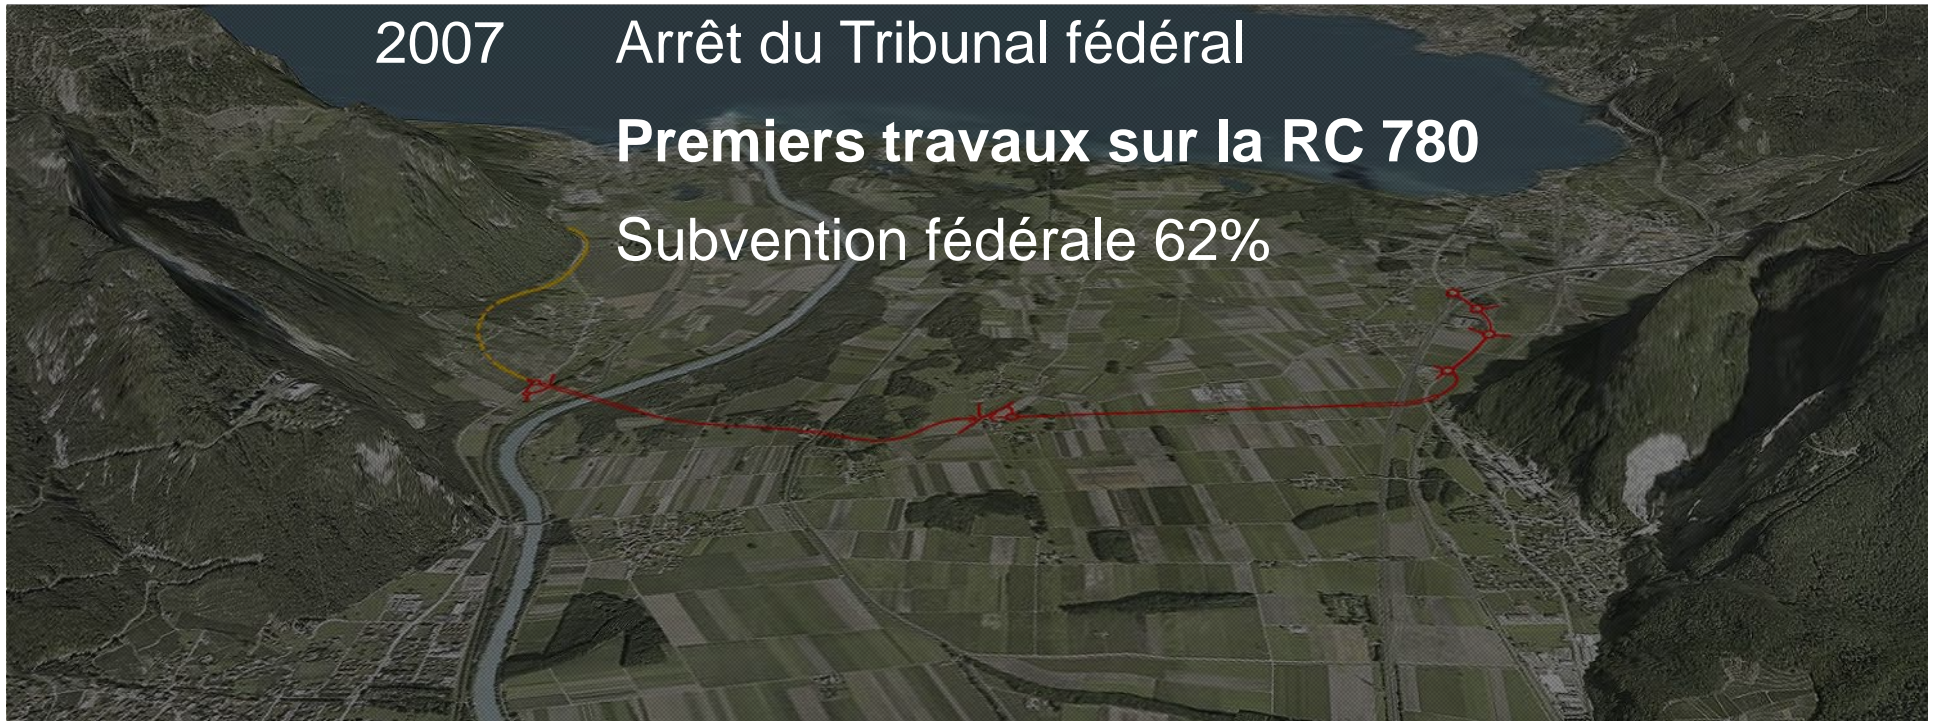


après 2007 trois calendriers

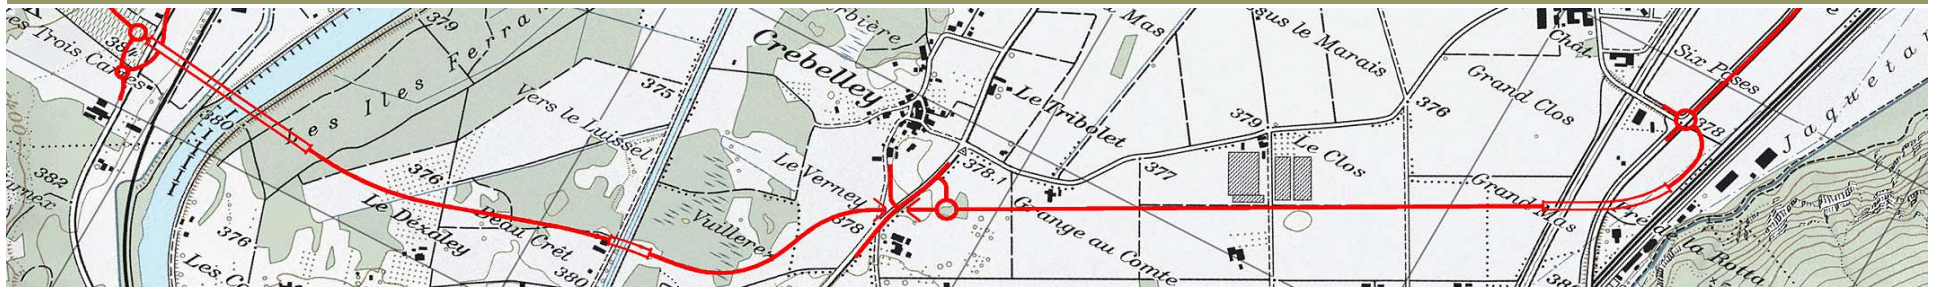

2. démarche technique (travaux)

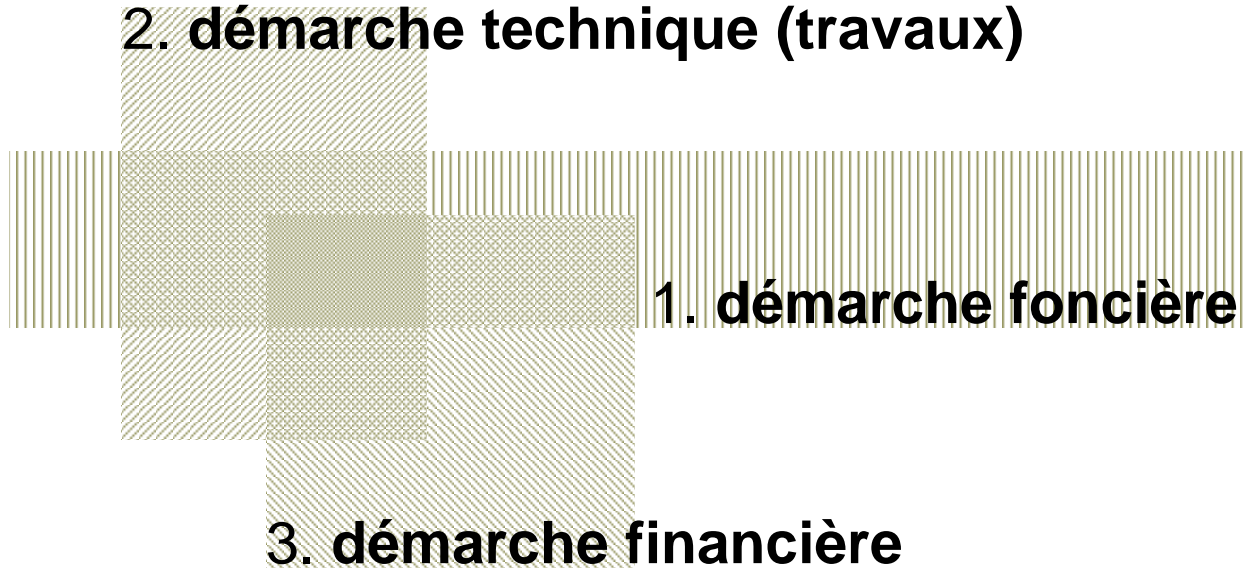

1. démarche foncière

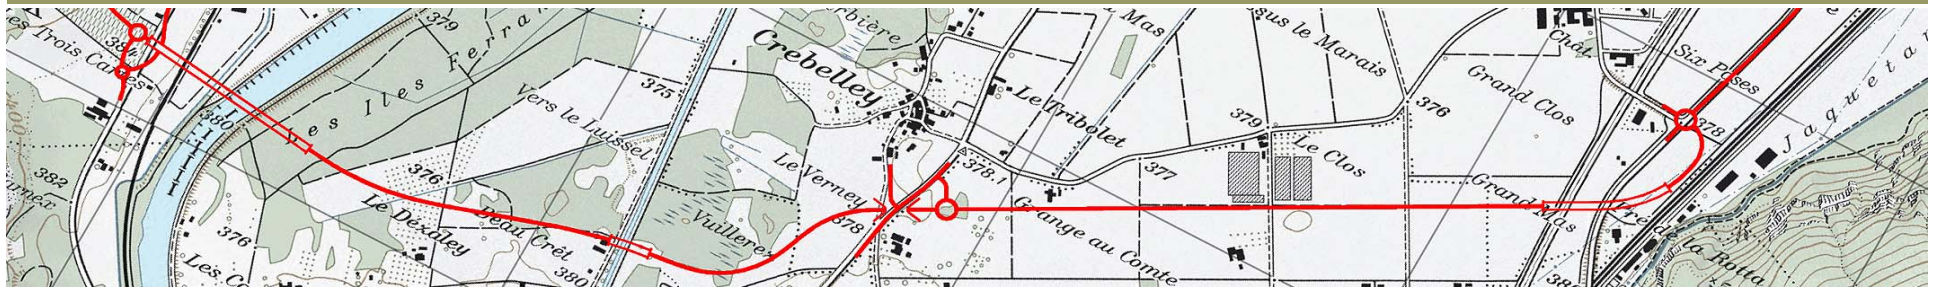

PRISES
DE POSSESSION
ANTICIPÉE

2007

ENQUÊTE PUBLIQUE

**Périmètre et sous-périmètres du syndicat
+ estimation des terres**

Enquête liquidée à fin oct. 2007


2008

ENQUÊTE PUBLIQUE

Avant-projet des travaux collectifs

Enquête terminée

1. démarche foncière

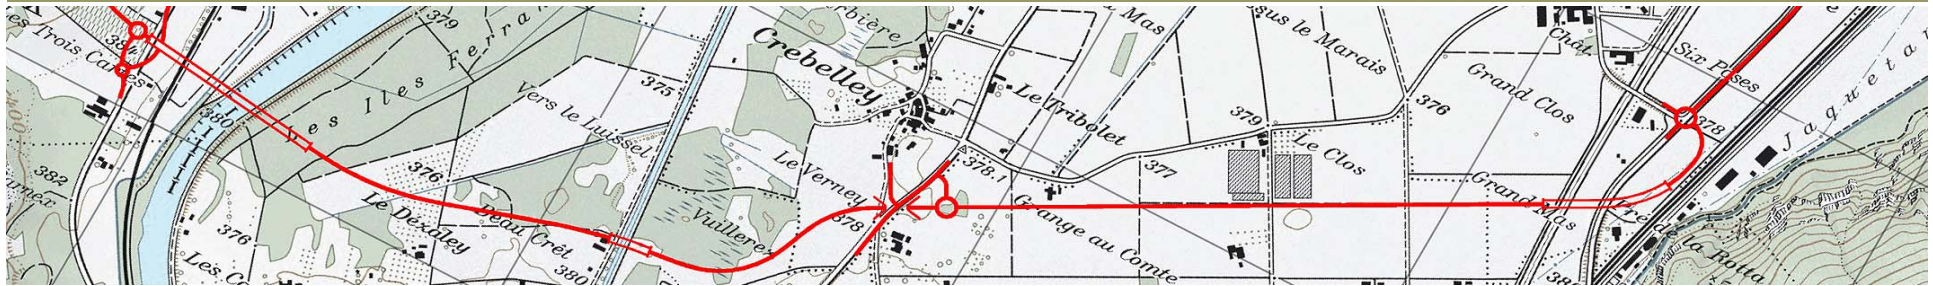

PRISES
DE POSSESSION
ANTICIPÉE

2011

ENQUÊTE PUBLIQUE


Estimation des terres et nouvel état

Travaux collectifs

Mise en culture

Transferts de propriétés

1. démarche foncière

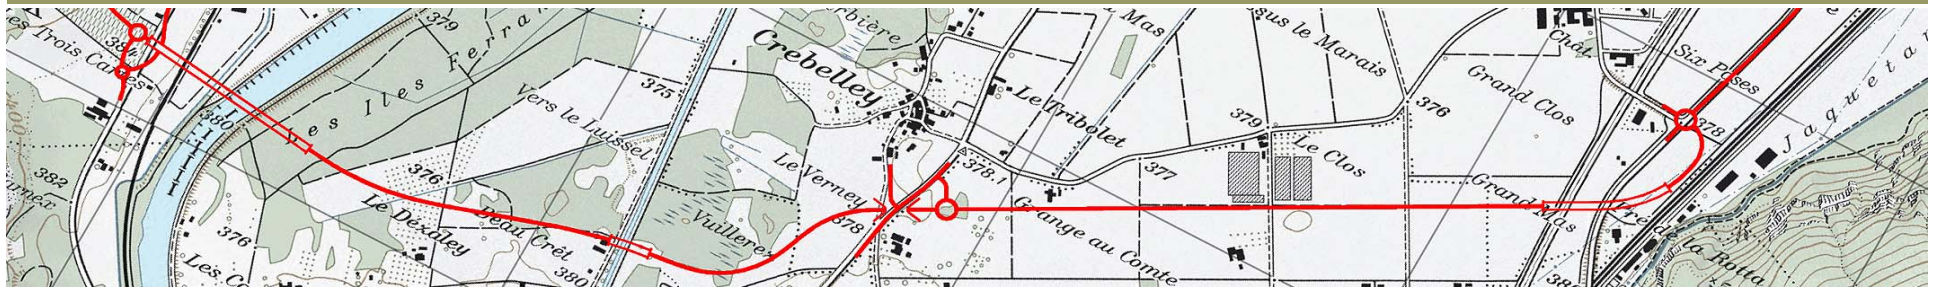

2012 **Abornement**


ENQUÊTE PUBLIQUE

Répartition des frais

Plan des ouvrages exécutés

Adaptation des limites après travaux

2. démarche technique

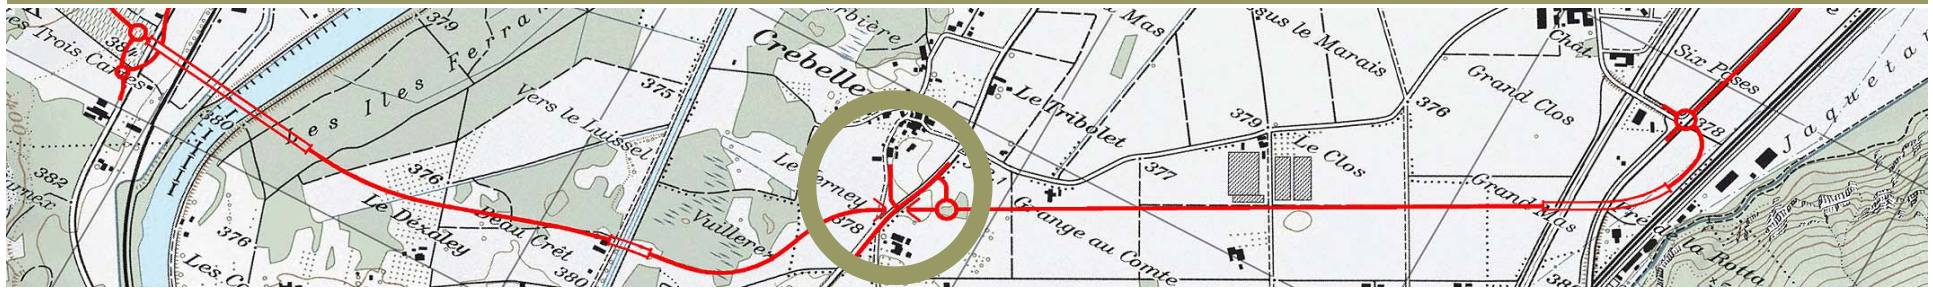

2007

Sondages géologiques complémentaires

UNE TRÈS MAUVAISE SURPRISE




Incidences techniques (projets)

Incidences financières (coûts)

Incidences temporelles (délais)

2. démarche technique

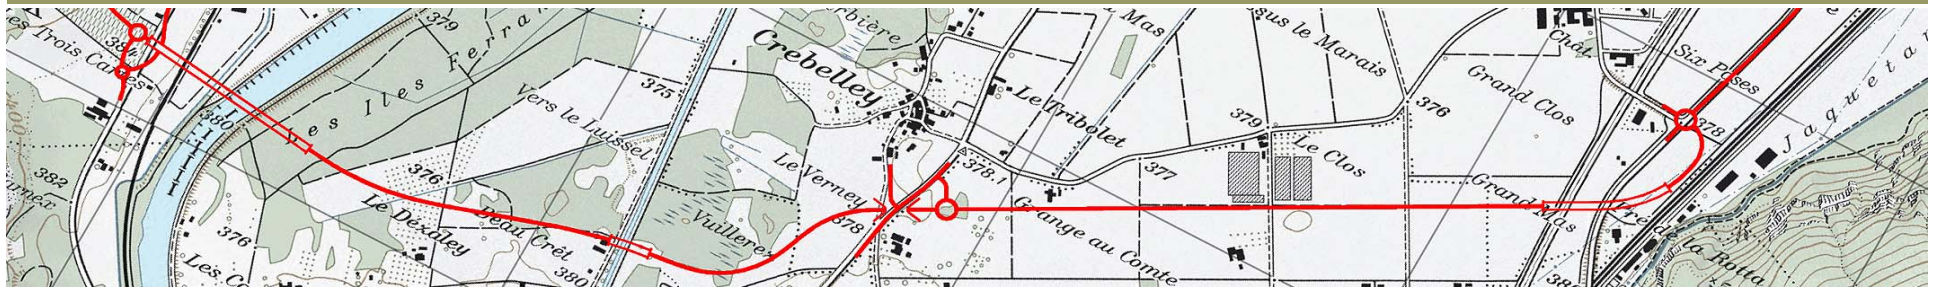

2008

ÉTÉ 2008 – DÉBUT 2009

**Études des ouvrages d'art
et des tracés à ciel ouvert**

2009


PRINTEMPS – ÉTÉ

Travaux préparatoires

AUTOMNE

Démarrage des travaux principaux


3. démarche financière

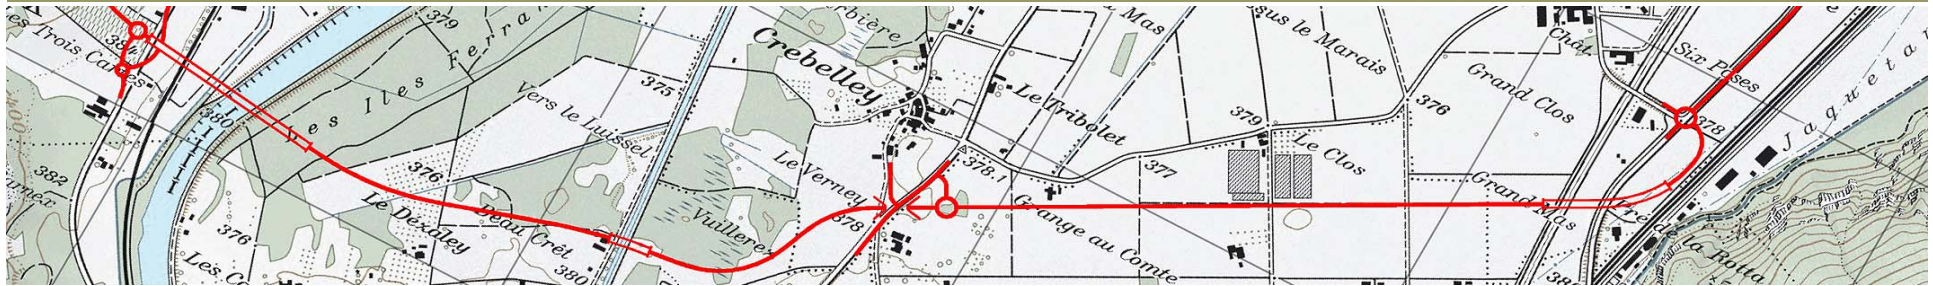


2003

Crédit d'ouvrage 79 Mios (valeur 2001)


2009 – 2012 déroulement des travaux

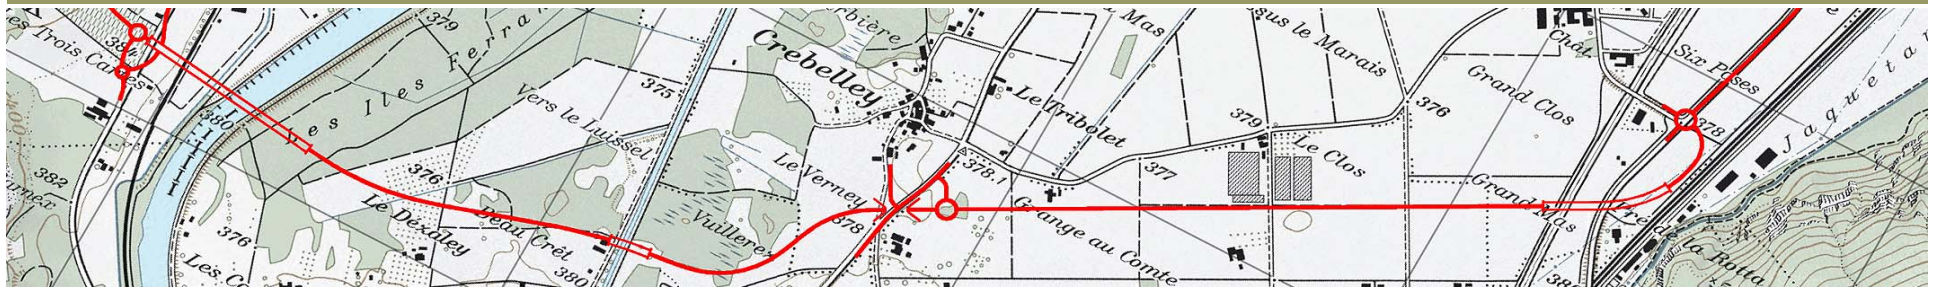


2009

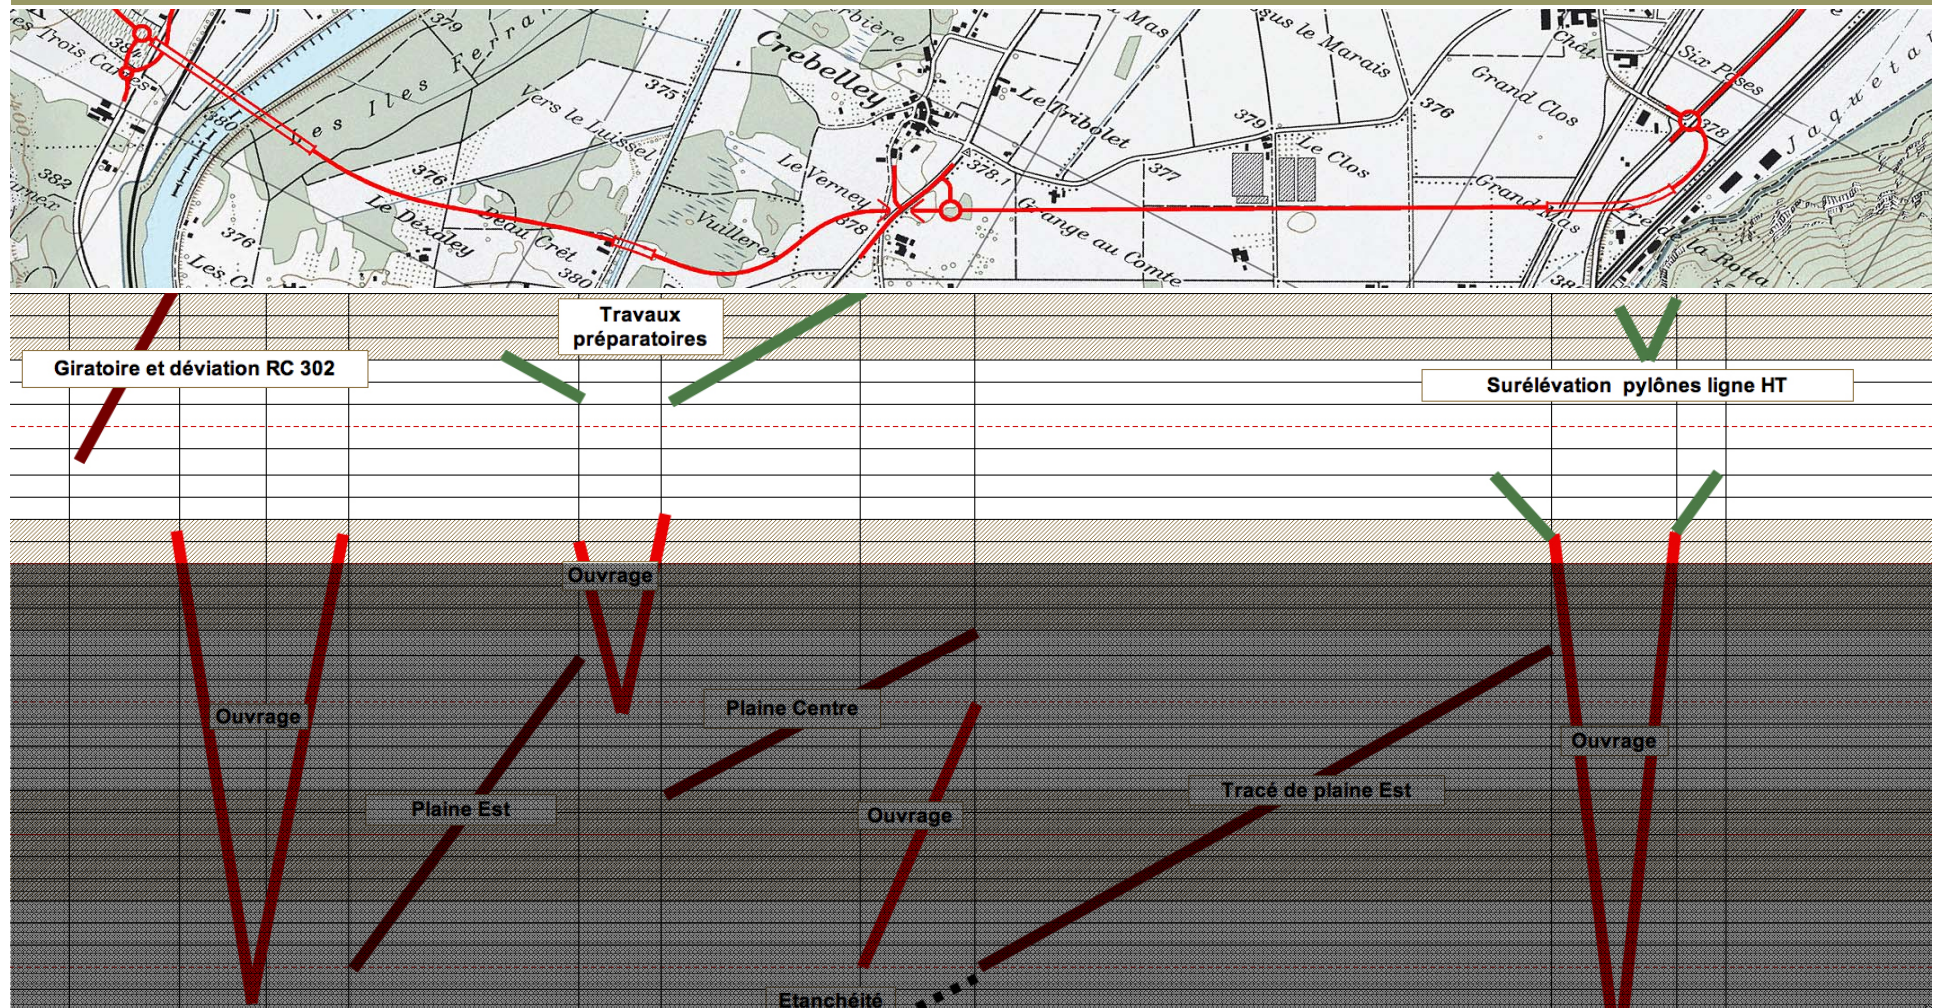



2010

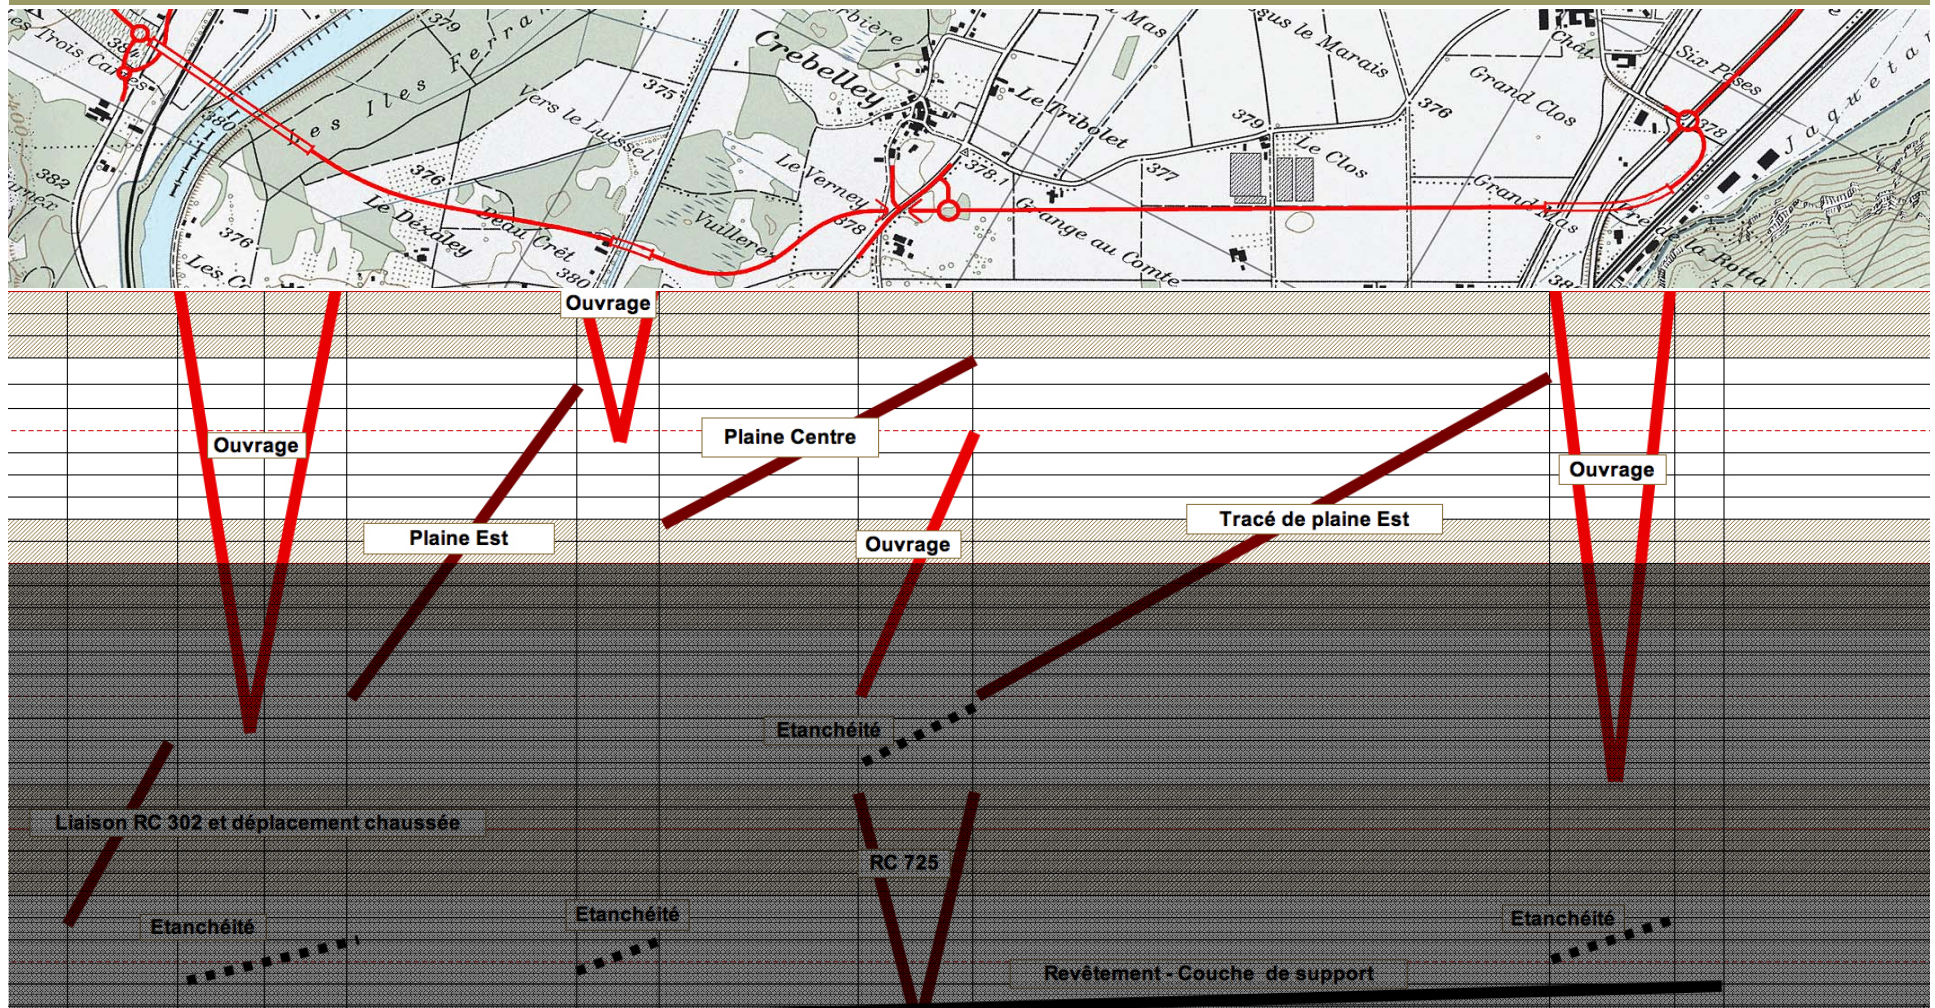


2011

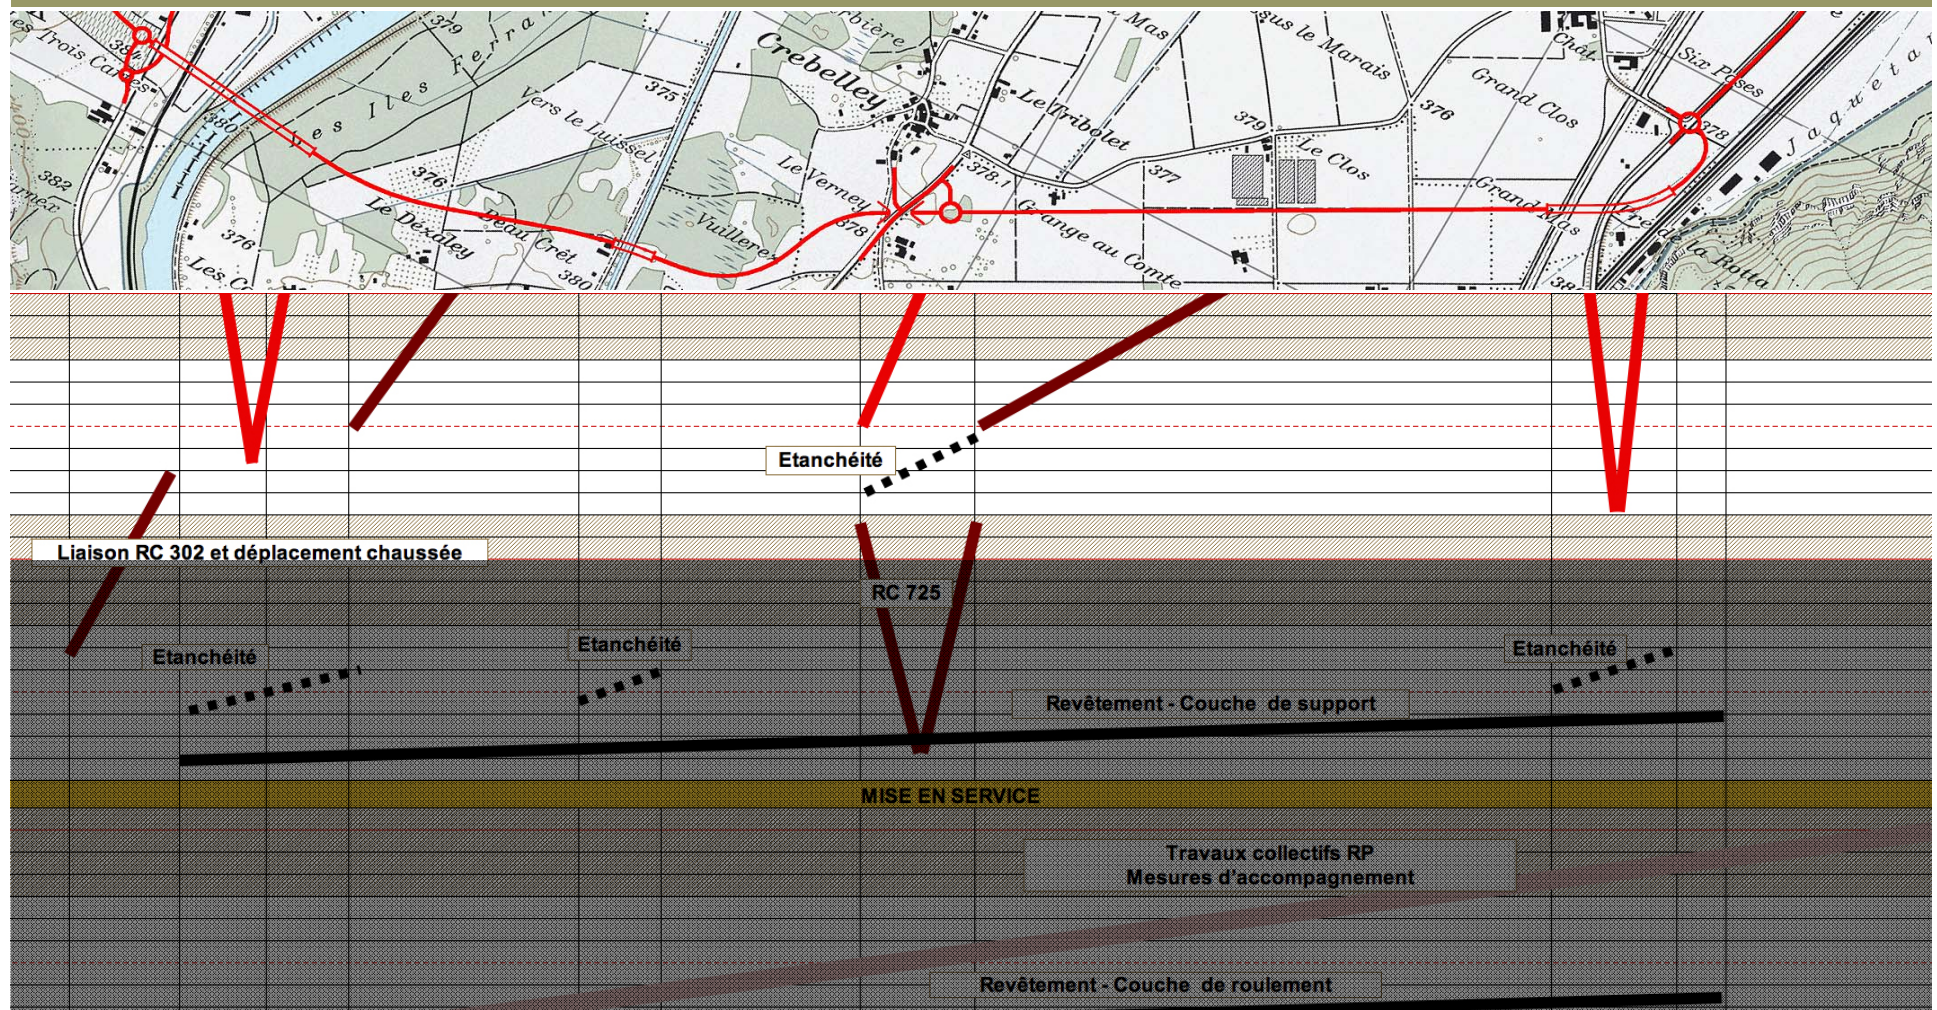

2012

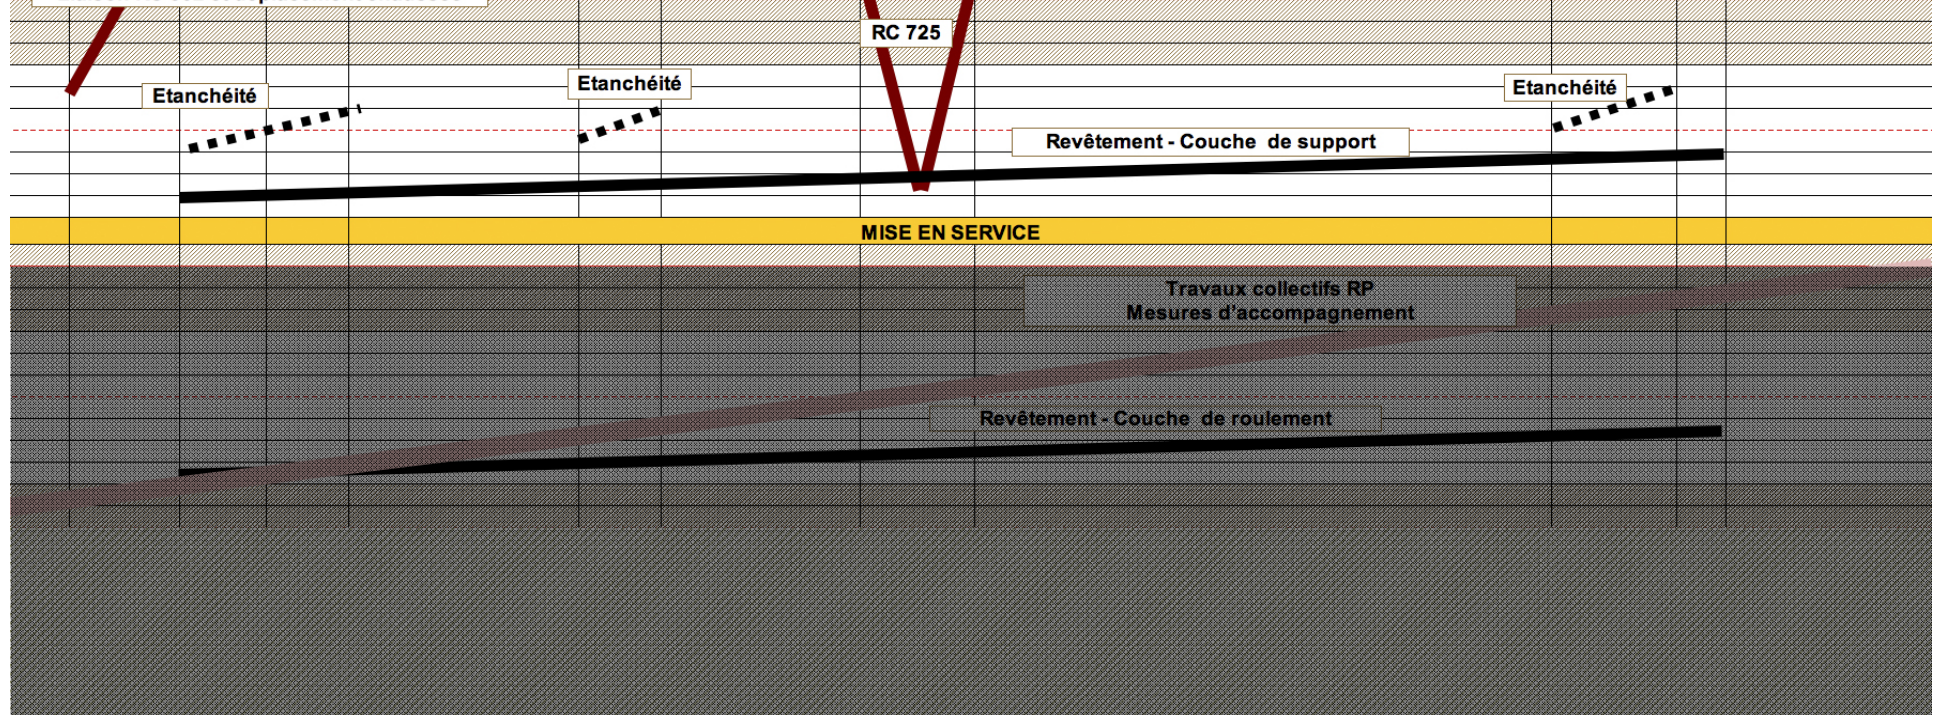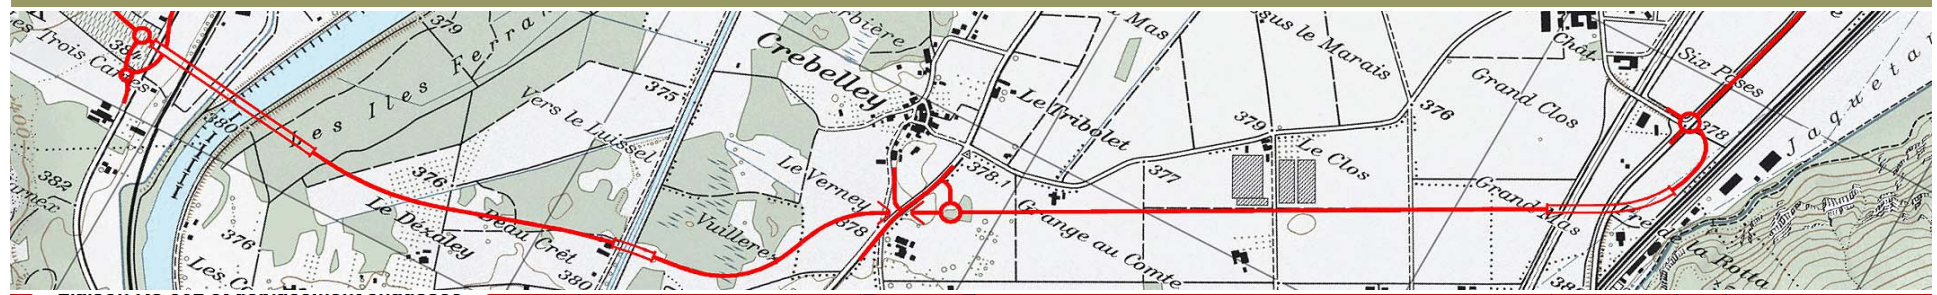


2013

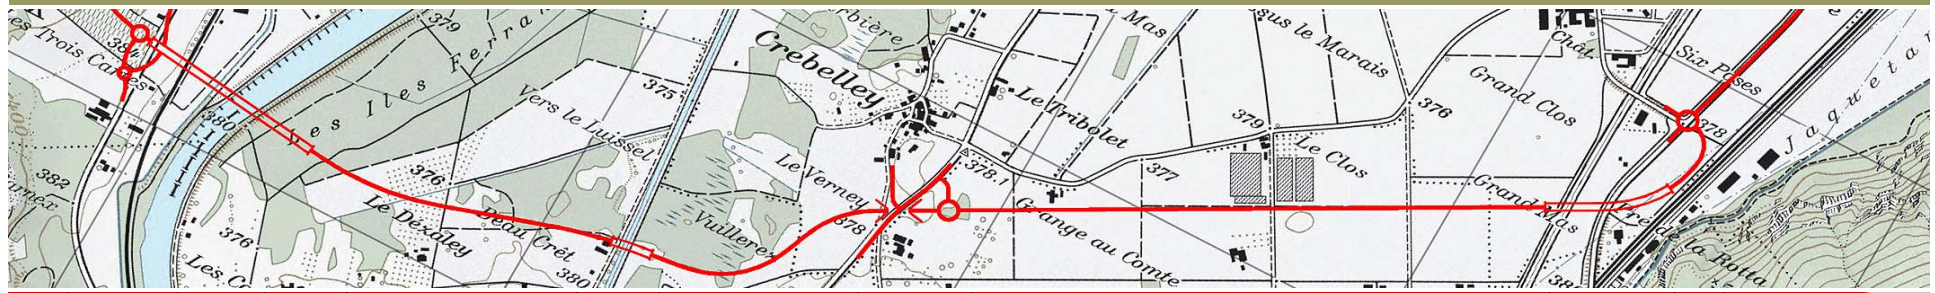

Travaux collectifs RP
Mesures d'accompagnement

Revêtement - Couche de roulement

organisation du chantier

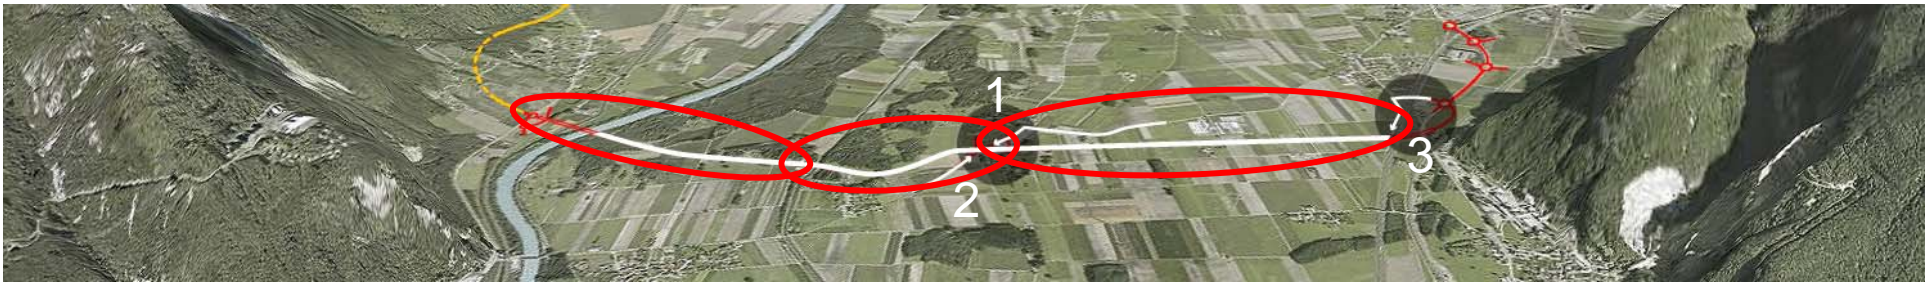

- | | |
|------|--|
| 2008 | Construction d'un pont provisoire |
| 2009 | Construction première piste de chantier
Crebelley – Grand Canal
Accès « chantier » limités en 3 points
impact diminué sur le réseau local RC
et chemins AF |
| 2010 | Construction pistes de chantier
sur le futur tracé |

en 2012 des villages libérés du trafic de transit

Des projets communaux d'espaces publics



H144 Transchablaisienne

Rennaz – Les Evouettes

